



Nordre Follo
kommune

HENT

Magasinparken ungdomsskole

FutureBuilt Del&Lær





Nordre Follo
kommune



Hvorfor samspill?

Fase 1

- Gode erfaringer fra samspill tidligere
- Utvikler bedre forprosjekt

Fase 2


- Velfungerende samspillsorganisasjon fra Fase 1
- Flere uavklarte grensesnitt i prosjektet – behov for fleksibilitet
- Usikkerheter i markedet



Nordre Follo
kommune


Erfaringer fra Fase 1

- Forberede BH-organisasjonen på samspill
- Anskaffelse med teamevaluering
- Kickoff – utarbeidelse av måldokument
- Temperaturmålinger underveis
- Spørreundersøkelse og evaluering

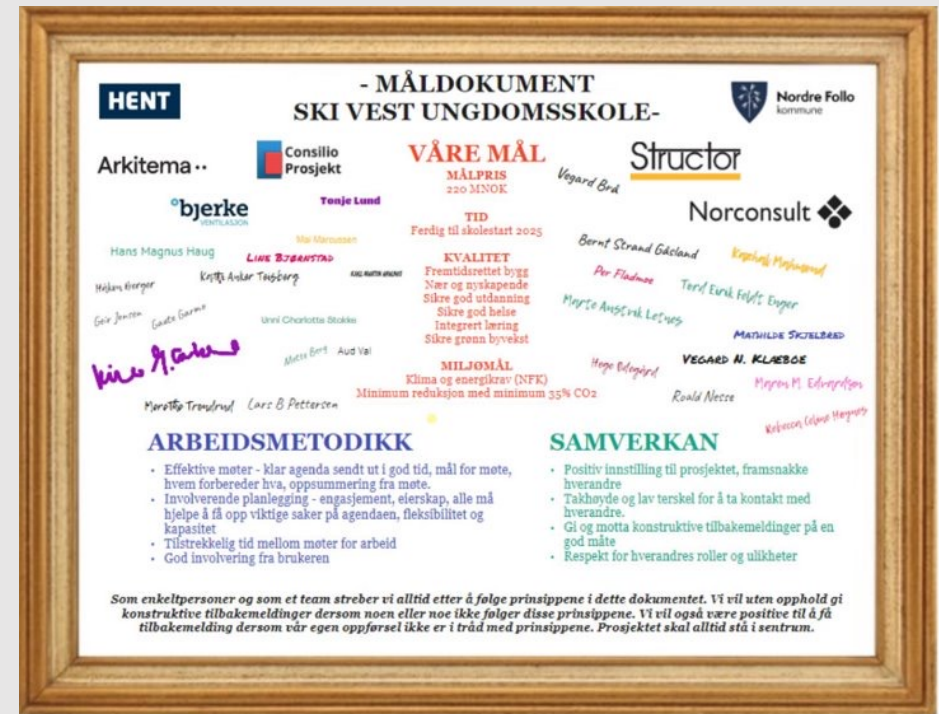


Nordre Follo
kommune

Anser du at prosjektgruppen alltid følger / handler etter måldokumentets samhandlingsprinsipper ?

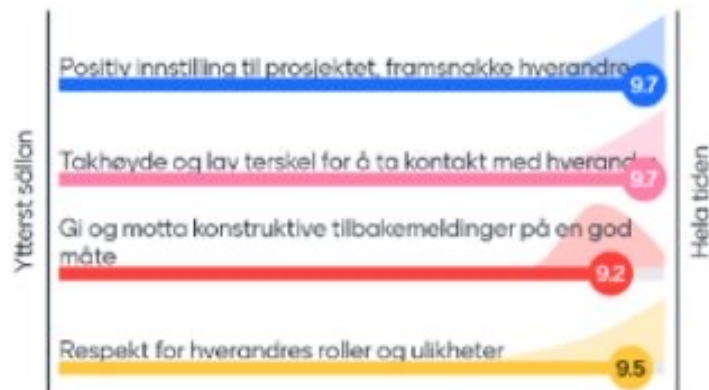

Anser du at prosjektgruppen hele tiden følger / jobber i tråd med måldokumentets arbeidsmetoder?

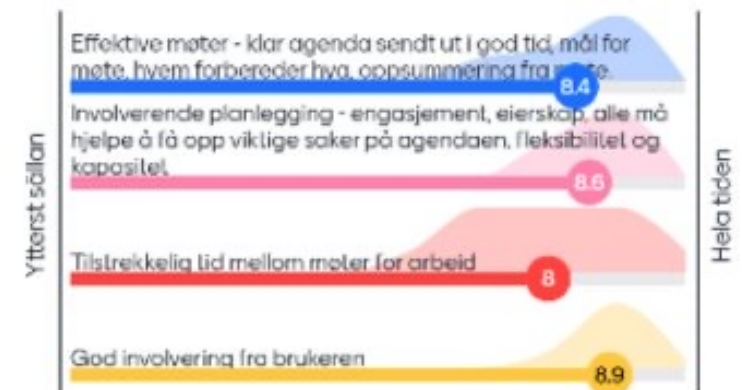

Basert på din personlige mening, anser du at prosjektteamet vil lykkes med å realisere følgende mål?



Nordre Follo
kommune



Overgang til Fase 2

- Kort overgangsperiode
- Ny kickoff for Fase 2
- Videreføring av de samme ressursene fra Fase 1
- Ny PL fra entreprenør



Nordre Follo
kommune



Erfaringer i Fase 2

- Mer fokus på de «harde verdiene», men drar med oss det gode samspillet fra Fase 1
- Mer ressurskrevende med samspill både for entreprenør og byggherre
- Nye ressurser i fase 2 hos TUE/UE som ikke kjenner all historikk
- Samspillskontrakter mellom TE og TUE
- Produksjonsressurser involvert i fase 1



Nordre Follo
kommune
